


Sommario	pag.
1. AREE INTERNE REGIONE CAMPANIA	3
2. PREMESSA	4
3. LA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE IN CAMPANIA	4
4. I TEMI DELLE STRATEGIE	6
5. DOTAZIONE FINANZIARIA SNAI CAMPANIA	7
6. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO	8
7. APQ ALTA IRPINIA: RIPARTO RISORSE E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	9
8. APQ VALLO DI DIANO: RIPARTO RISORSE E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	14
9. APQ TAMMARO TITERNO - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	18
10. APQ CILENTO INTERNO - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	26
11. INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NELLE AREE INTERNE. DLGS N. 120/2021	32
12. CRITICITÀ E SUCCESSI	33
13. CONCLUSIONI	33

1. AREE INTERNE REGIONE CAMPANIA

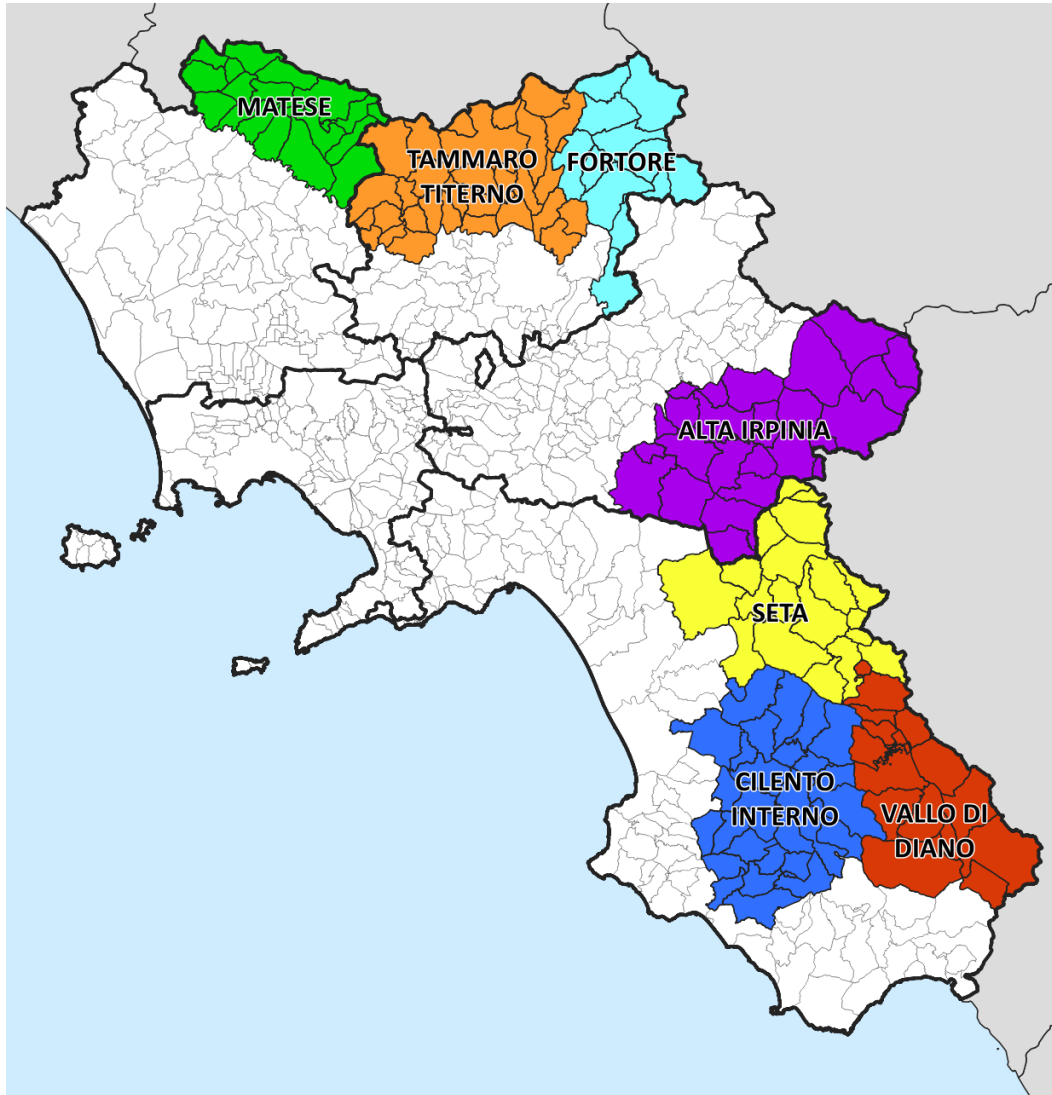

Elaborazione grafica Staff 50.09.92 Regione Campania

2. PREMESSA

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una politica nazionale a forte valenza locale, che opera per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento che caratterizzano gran parte delle aree interne italiane promuovendone la diversità, migliorando la qualità dei *cd* servizi di cittadinanza (Salute, Istruzione e Mobilità) e stimolando la capacità dei cittadini residenti di immaginare e realizzare nuovi percorsi per l'innovazione e il cambiamento. Per "aree interne" si intendono le porzioni di territorio caratterizzate sia da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi, ma anche da una disponibilità elevata di importanti risorse ambientali e culturali.

Nel breve periodo, la Strategia ha il duplice obiettivo di adeguare quantità e qualità dei servizi di cittadinanza e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste aree, puntando anche su filiere produttive locali.

Nel lungo periodo l'obiettivo della Strategia nazionale per le aree interne è quello di invertire le attuali tendenze demografiche delle aree interne del Paese.

Gli interventi della SNAI vengono realizzati con risorse europee (FESR, FSE e FEASR) e nazionali (Leggi di stabilità 2014, 2015, 2016 e Legge di Bilancio per il 2018). Con il D.L. n. 120/2021 sono state destinate ulteriori risorse per la realizzazione di interventi di contrasto agli incendi boschivi (CIPESS n. 8/2022).

Le aree d'intervento vengono individuate con una procedura di istruttoria pubblica svolta dalle Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne, dalla Regione interessata e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. La governance è affidata al Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'amministrazione di riferimento, in relazione all'attuazione e alla gestione degli interventi, è l'Agenzia per la coesione territoriale. Lo strumento attuativo della SNAI è l'APQ (Accordo di Programma Quadro *ex articolo 1, comma 15 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013*) attraverso cui Regioni, Enti Locali e Amministrazioni centrali (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e il Ministero della salute, ma se ne ricorrono i presupposti anche altre Amministrazioni Centrali) assumono gli impegni vincolanti per la realizzazione degli obiettivi

3. La Strategia Nazionale Aree Interne in Campania

Il coordinamento e l'attuazione degli APQ della Regione Campania sono affidati all'Ufficio Speciale del Federalismo che, con l'affiancamento dell'Ufficio della Programmazione Unitaria ed in accordo con il partenariato locale coinvolto, ne ha seguito anche la genesi.

Con DGR n. 600 del 1.12.2014 la Regione Campania ha individuato le prime quattro aree campane (Alta Irpinia, Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro-Titerno) indicando l'Alta Irpinia quale area pilota. Con la stessa DGR è stato previsto un impegno integrato a valere sui tre fondi comunitari (FESR, FSE e FEASR) per complessivi 65 milioni di euro a cui si sono aggiunte, per la componente di riequilibrio dei servizi di base, le risorse nazionali a valere sulla Legge di Stabilità 2014, pari a circa 3,740 milioni di euro per ciascuna area.

In attuazione del D.L. n. 120 dell'8 settembre 2021, che destina risorse in favore degli enti territoriali per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, con DGR n.311 del 21 giugno 2022, sono state assegnate alle Aree Interne della Campania ulteriori risorse per circa 2,211 milioni di euro per gli 11 progetti selezionati.

Le 4 aree interne selezionate nel periodo di programmazione 14-20 interessano 93 comuni estesi su una superficie di 3.470 Km² con una popolazione di circa 223 mila abitanti ed una densità abitativa è in media di 67,3 ab/Km². Il 13% della popolazione ha meno di 16 anni ed il 25% è ultrasessantacinquenne (tabella1).

In coerenza con le previsioni dell'Accordo di Partenariato 2021-27 e con il Documento Strategico Regionale della Campania, con DD.GG.RR n. 602 del 28/12/2021, n.218 del 10/05/2022 e n.423 del 03/08/2022, sono state individuate tre nuove aree interne denominate rispettivamente "Alto Matese", "Sele Tanagro Alburni SETA" e "Fortore". Le 3 nuove aree interessano complessivamente 48 nuovi comuni estesi su una superficie di 1.839 Km² con una popolazione di circa 119.224 abitanti ed una densità abitativa di 63,6 ab/km² (tabella2).

Dal 6 giugno 2023 è disponibile on line il dossier "Regione Campania giugno 2022" realizzato nell'ambito del progetto "La strategia Nazionale delle Aree interne e i nuovi assetti istituzionali", Convenzione DFP - PA, che contiene una analisi sulle caratteristiche delle 7 Aree SNAI della Campania.

Il dossier è disponibile all'indirizzo <https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/le-aree-interne-2021-2027/documentazione-strategica-regioni-e-pa/regioni-del-sud/regione-campania/>

Tab. 1 - Aree selezionate per il periodo di programmazione 2014-2020 Fonte ISTAT 2020

AREA	n. comuni	Popolazione residente	%Variazione demografica	Superfici (km ²)	Densità abitativa (ab/km ²)	% Popolazione 0-14 anni	% Popolazione 15 -64 anni	% Popolazione oltre 65 anni	% Stranieri residenti
Alta Irpinia	25	58.071	- 9,80	1.118,02	51,94	10,70	65,26	26,29	2,79
Vallo di Diano	15	56.557	- 5,95	725,31	77,97	12,28	66,15	23,78	5,11
Tammaro Titerno	24	59.893	- 8,20	677,14	88,44	11,57	65,47	25,56	3,47
Cilento Interno	29	45.640	- 9,61	949,40	48,07	10,96	63,86	27,06	5,11

Tab. 2 - Aree selezionate per il periodo di programmazione 2021-2027 Fonte ISTAT 2020

AREA	n. comuni	Popolazione residente	%Variazione demografica	Superficie (km ²)	Densità abitativa (ab/km ²)	% Popolazione 0-14 anni	% Popolazione 15-64 anni	% Popolazione oltre i 65 anni	% Stranieri residenti
Alto Matese	17	37.212	- 8,73	534,63	69,60	11,94	66,04	24,41	2,41
Fortore Beneventano	12	26.024	- 11,81	519,72	50,07	11,09	62,67	28,90	2,28
Sele Tanagro	19	55.988	-5,31	784,86	71,33	12,88	66,81	22,79	3,90

Il CIPE, con le delibere n. 9/2015, 43/2016, 80/2017 e ss.mm.ii., ha approvato gli indirizzi operativi della Strategia Nazionale per le aree interne ed ha provveduto al riparto delle risorse nazionali stanziare.

Il percorso di costruzione di una Strategia d'Area, così come delineata dal CTAI si sviluppa come segue:

1. Elaborazione della bozza di strategia
2. Preliminare di strategia

3. Animazione e co-progettazione degli interventi
4. Definizione della Strategia d'area.
5. Perfezionamento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) con la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti

La tempistica delle fasi che hanno portato alla sottoscrizione degli APQ della programmazione 2014-2020 (Tab. n.3) evidenzia criticità legate ai tempi per l'approvazione della Strategia d'Area e per la sottoscrizione degli APQ.

Tab. 3- Iter definizione Strategia – Sottoscrizione APQ (approvazioni da parte del CTAI)


AREA	BOZZA DI STRATEGIA	PRELIMINARE DI STRATEGIA	STRATEGIA D'AREA	PERFEZIONAMENTO APQ
ALTA IRPINIA	Agosto 2015	Marzo 2016	Maggio 2017	Settembre 2017
VALLO DI DIANO	Maggio 2016	Luglio 2017	Agosto 2018	Aprile 2019
TAMMARO TITERNO	Marzo 2018	Maggio 2019	Settembre 2020	Novembre 2021
CILENTO INTERNO	Dicembre 2017	Maggio 2019	Marzo 2020	Dicembre 2021

4. I temi delle Strategie

Le strategie d'area degli APQ perfezionati al 31 dicembre 2022 hanno evidenziato la necessità del rafforzamento dell'identità culturale e del senso di appartenenza dei residenti, pertanto, gran parte degli interventi sono stati finalizzati allo sviluppo locale, al potenziamento dei sistemi produttivi e del turismo. In particolare, nell'Area Alta Irpinia sono state impegnate molte risorse nei settori agricolo e sanitario, nell'Area Vallo di Diano l'impegno maggiore è dedicato al settore dell'istruzione mentre nelle Aree Cilento interno e Tammaro Titerno sono previsti numerosi interventi nella Sanità.

Tutte le strategie dedicano inoltre risorse per il potenziamento dei servizi digitali e della mobilità (sia interna che esterna).

Ambiti di intervento previsti nelle strategie

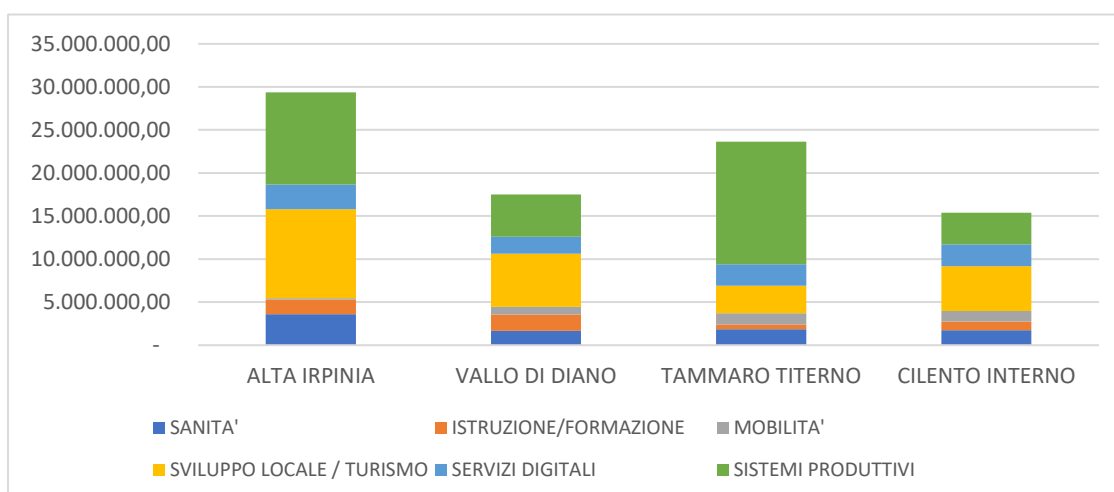

*non sono contemplate le risorse a disposizione dell'assistenza tecnica

5. Dotazione finanziaria SNAI Campania

Le risorse disponibili per l'attuazione dei 4 APQ sottoscritti al 31 dicembre 2022 ammontano ad oltre 85 milioni di euro a cui vanno aggiunti (ex 4, c. 2, D.L 120/2021) 2,21 milioni per gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi nelle aree interne ed ulteriori 300 mila euro per ciascuna area ex art. 1, comma 314 della legge 160 del 2019 (annualità 2021).

Con delibera CIPESS n. 41/2022 sono state assegnati 4 milioni di euro a ciascuna delle nuove aree selezionate, a cui si andranno ad aggiungere anche le risorse previste nei Programmi Regionali 21-27 a favore delle aree interne.

Nel grafico a seguire, è rappresentata la distribuzione delle risorse per fonte di finanziamento dei 4 APQ sottoscritti al 31 dicembre 2022, da cui si evince che il FESR finanzia il 41% sul totale delle risorse, segue il FEASR con il 37%, la Legge di stabilità con il 18%, ed il FSE con il 4%.

Tab. 3- Dotazione finanziaria SNAI al 31 dicembre 2022


DOTAZIONE FINANZIARIA						PROGETTI N.
APQ	FESR	FSE	FEASR	LEGGE DI STABILITA'	TOTALE	
ALTA IRPINIA*	13.228.073,90	1.707.000,00	10.700.000,00	3.740.000,00	29.375.073,90	23
VALLO DI DIANO	9.353.000,00	930.049,00	3.700.000,00	3.720.320,00	17.703.369,00	21
TAMMARO TITERNO	5.704.270,00	137.120,00	13.889.100,00	3.754.007,27	23.484.497,27	29
CILENTO INTERNO	7.220.000,00	397.280,00	3.700.000,00	3.760.000,00	15.077.280,00	22**
TOTALE	35.505.343,90	3.171.449,00	31.989.100,00	14.974.327,27	85.640.220,17	95

Fonte: nostre elaborazioni su dati SURF

* Non è contemplato l'intervento a valere sul POC "Ristrutturazione urbanistica e ripristino della fontana monumentale", per l'importo di € 1.600.000,00, che ha come beneficiario il Comune di Torella dei Lombardi.

** L'intervento 1.3 "Programma di efficientamento energetico" non è ammissibile, per cui non è stato conteggiato.

Distribuzione risorse per fonte di finanziamento

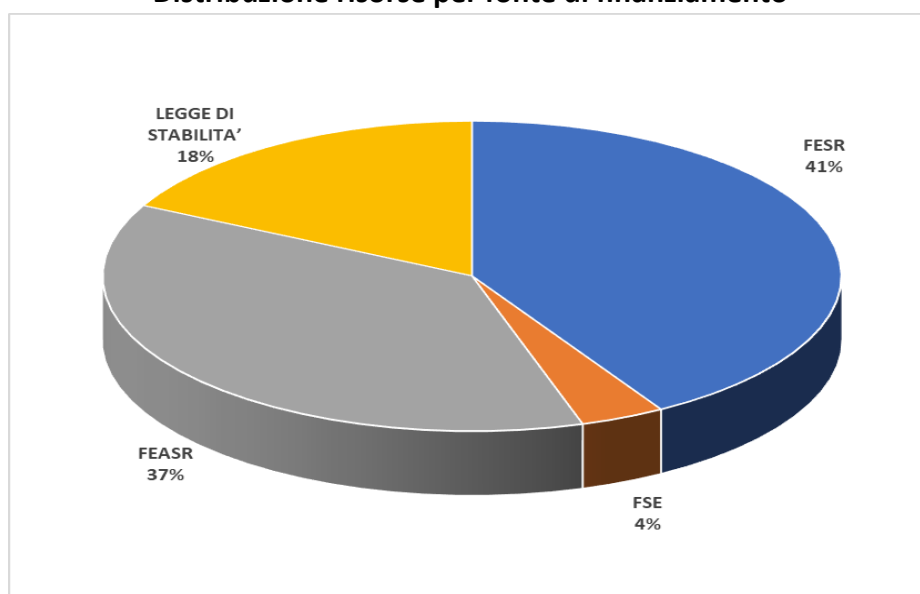

6. Stato di Attuazione degli Accordi di Programma Quadro

Al 31 dicembre 2022, l'ammontare complessivo dei pagamenti è pari a circa 8 milioni di euro, di cui il 64% relativo ai 34 progetti in corso di attuazione a valere sulla Legge di Stabilità, mentre il restante 36% afferisce ai Fondi SIE. Il FESR conta 23 progetti in corso di attuazione, il FSE ha in corso solo quello relativo alla creazione di un Fablab - tutorship e qualificazione imprese nell'area Vallo di Diano, il FEASR ha finanziato 3 progetti relativi alla costituzione di una partnership pubblico – privata per la definizione di un programma di investimenti nella filiera zootecnica e forestale (Alta Irpinia) e nella filiera cerealicola (Vallo di Diano).

Si evidenzia una generale ripresa nell'attuazione dei progetti sia afferenti ai Fondi che alla Legge di stabilità, la capacità di spesa, infatti, rispetto allo scorso anno è quasi raddoppiata, passando dal 5% al 9%.


Tab. 4- Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2022

AVANZAMENTO FINANZIARIO					
FONDI	DOTAZIONE FINANZIARIA	IMPEGNI	PAGAMENTI	capacità di spesa in %	capacità d'impegno in %
LEGGE STABILITA'	14.974.327,27	5.549.153,97	5.035.941,15	33,6	37,1
FONDI SIE	70.665.892,90	14.697.322,27	2.796.148,53	4,0	20,8
TOTALE	85.640.220,17	20.246.476,24	7.832.089,68	9,1	23,6

Fonte: nostre elaborazioni su dati SURF

Per la Legge di Stabilità, gli importi relativi ai pagamenti dell'Alta Irpinia e Vallo di Diano sono quelli validati dai beneficiari e caricati sulla piattaforma SURF, mentre per il Tammaro e il Cilento gli importi si riferiscono all'anticipazione erogata. Per i Fondi SIE gli importi indicati riguardano i trasferimenti effettuati a titolo di anticipazione, ad eccezione del PSR per il quale si tratta di liquidazioni finali relative alla conclusione della fase A.

Distribuzione dei pagamenti per fonte di finanziamento

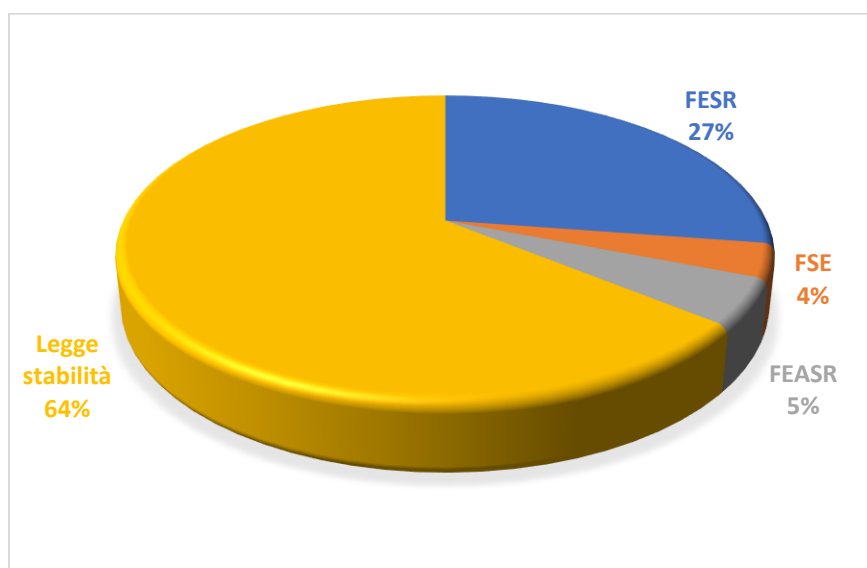

Stato di Attuazione procedurale

La Strategia Nazionale Aree Interne in Campania è costituita da 95 progetti (Tab. 5), 57 dei quali in corso di attuazione, 6 conclusi e 32 non avviati (alcuni in fase di riprogrammazione ed altri senza decreto di ammissione definitiva).

Tab. 5- Avanzamento procedurale al 31 dicembre 2022

Stato progetti	FESR	FSE	FEASR*	LEGGE DI STABILITA'	TOTALE
Progetti ammessi	30	11	7	47	95
Progetti non avviati	7	10		15	32
Progetti in corso attuazione	22	1	7	27	57
Progetti conclusi	1			5	6


Fonte: nostre elaborazioni su dati SURF

*3 progetti hanno concluso la fase A (2 per l'Alta Irpinia e 1 per il Vallo di Diano)

7. APQ Alta Irpinia: Riparto risorse e stato di attuazione degli interventi

I progetti approvati sono 23 per un ammontare di risorse destinate pari a circa 30 milioni di euro; oltre il 70% di queste risorse (Tab.6) è dedicato a progetti di promozione del patrimonio culturale, ambientale (FESR) ed al potenziamento dei sistemi produttivi territoriali (FEASR) a cui seguono, in ordine decrescente di destinazione delle risorse, gli interventi in materia di salute con il 12% e servizi digitali (10%) ed infine quelli per formazione e mobilità (7%).

Tab 6 Distribuzione risorse per Settore d'intervento

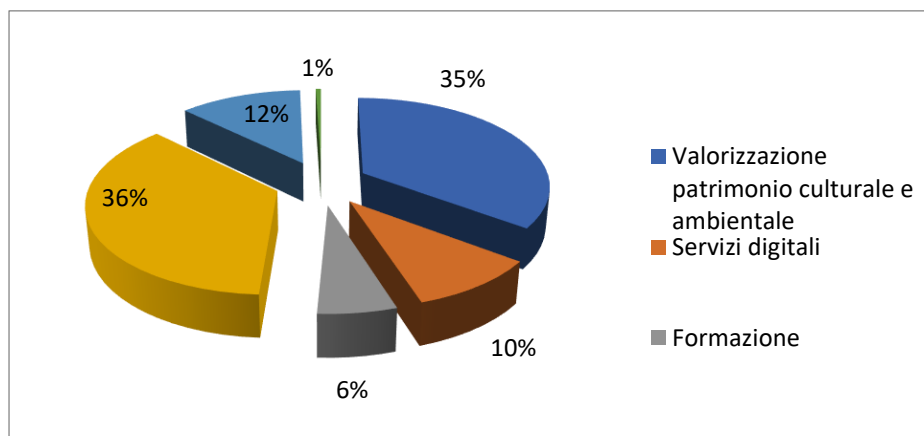

Gli interventi finanziati con la **Legge di stabilità** sono 10, di cui 8 in materia di salute e 2 destinati al potenziamento mobilità, sono disciplinati dalle Delibere CIPE¹ mentre il "Disciplinare delle procedure per gli

¹ Delibere CIPE n. 9 del 2015, n. 43 del 2016, n. 80 del 2017, n. 52 del 2018 e n. 72 del 2019 e ss.mm.ii

interventi dell'APQ Area Interna Alta Irpinia finanziati con Legge di Stabilità nazionale", approvato con DD n.7 del 23.01.2018 regola le modalità di attuazione.

APQ ALTA IRPINIA: LEGGE STABILITA' QUADRO DEGLI INTERVENTI				
N. SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	DOTAZIONE FINANZIARIA	Settore	ATTUATORE
1.1	Potenziamento del ruolo del P.O. "G. Criscuoli": startup di cardiologia previsti dal D.C.A. 33/ 2016.	340.000,00	Sanità	ASL AVELLINO
1.2	Realizzazione dell'Ospedale di Comunità' c/o la SPS di Bisaccia.	445.000,00	Sanità	ASL AVELLINO
1.3	Realizzazione della UCCP con sede nella SPS di Bisaccia - distretto di S. Angelo dei Lombardi.	395.000,00	Sanità	ASL AVELLINO
1.4	Realizzazione Speciale Unita' per l'accoglienza Permanente dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza c/o la SPS di Bisaccia.	1.035.851,87	Sanità	ASL AVELLINO
1.5	Progetto di teleradiologia: realizzazione di una rete informatica ospedaliera tra il Presidio Ospedaliero "Criscuoli" di S. Angelo dei Lombardi, con l'AORN Moscati di Avellino e con gli altri Presidi della ASL.	130.000,00	Sanità	ASL AVELLINO
1.6	Attivazione del servizio Ospedale di Comunità' c/o la SPS di Bisaccia.	265.000,00	Sanità	ASL AVELLINO
1.7	Attivazione dell'UCCP con sede nella SPS di Bisaccia - distretto di S. Angelo dei Lombardi.	265.000,00	Sanità	ASL AVELLINO
1.8	Attivazione del servizio Speciale Unita' per l'accoglienza Permanente dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella SPS di Bisaccia.	714.148,13	Sanità	ASL AVELLINO
3.1	Piano della mobilità di area vasta. (implementazione piano)	85.000,00	Mobilità	ACAMIR
3.2	Piano della mobilità di area vasta (sperimentazione servizi innovativi TPL)	65.000,00	Mobilità	ACAMIR
		3.740.000,00		

SALUTE

L'attuazione degli 8 progetti, per un importo complessivo di 3.590.000 euro, è affidata all'ASL di Avellino.

Alla data del 31 dicembre 2022 risultano conclusi i seguenti progetti per i quali si è in attesa della rendicontazione finale da parte del soggetto attuatore:

- **Scheda progetto 1.1** Potenziamento dell'Ospedale Criscuoli (realizzati 6 posti letto);
- **Schede progetto 1.2 e 1.6** Realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Bisaccia ed attivazione del servizio (realizzati 10 posti letto);
- **Schede progetto 1.4 e 1.8** Speciale Unità per l'Accoglienza Permanente dei Pazienti in Stato Vegetativo e di Minima Coscienza ed attivazione del servizio (realizzati 10 posti letto);
- **Scheda progetto 1.5** "Progetto di Teleradiologia (implementazione di una piattaforma informatica che mette in rete diversi presidi sanitari, gestione informatizzata delle richieste di prestazioni radiologiche dai reparti ospedalieri e distribuzione degli esiti).

Gli interventi **Scheda progetto 1.3** "Realizzazione della UCCP con sede nella SPS di Bisaccia" e **Scheda progetto 1.7** "Attivazione dell'UCCP con sede nella SPS di Bisaccia" sono in fase di riprogrammazione.

MOBILITÀ

L'attuazione dei 2 interventi in materia di mobilità, **Schede progetto 3.1 e 3.2**, è affidata all'Acamir (Agenzia Campania Mobilità Infrastrutture e Reti). I due progetti risultano alla data del 31 dicembre 2022 in fase di riprogrammazione.

FESR

I 2 interventi, **Schede progetto 3.3 e 4.1**, sono in corso di attuazione tranne quello relativo al Museo etnografico di Aquilonia che è concluso e quello relativo a “Ambiente, natura e territorio” che non risulta ancora avviato.

APQ ALTA IRPINIA: INTERVENTI FINANZIATI DAL FESR			
N. SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	BENEFICIARIO	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
3.3	Agenda digitale Alta Irpinia -servizi digitali avanzati nei comuni dell'Alta Irpinia.	COMUNE TORELLA DEI LOMBARDI	2.879.482,00
4.1	Completamento Palazzo Palmieri - Museo Arte del Vino e della Viticoltura- Comune di Castelfranci	COMUNE DI CASTELFRANCI	1.000.000,00
	Museo e Archivio Storico Diocesano-Comune di Nusco	Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi	3.300.000,00
	Completamento, restauro ed adeguamento funzionale dell'Abbazia del Goleto- Comune di Sant'Angelo dei Lombardi	Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi	3.000.000,00
	Progetto integrato di valorizzazione "Ambiente, Natura, Territorio e Archeologia Comune di Conza	COMUNE DI CONZA	2.290.000,00
	Museo Etnografico - Comune di Aquilonia *	COMUNE DI AQUILONIA	758.591,90
			13.228.073,90

FSE

I 5 progetti, **Schede progetto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5**, sono tutti in fase di riprogrammazione

APQ Alta Irpinia. Interventi finanziati dal FSE			
N. SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	BENEFICIARIO	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
2.1	Percorso di formazione e aggiornamento dei docenti dell'alta Irpinia, propedeutica all'attuazione degli interventi della strategia per la scuola.	Istituti scolastici	120.000,00
2.2	Scuola Viva in Alta Irpinia. Azione per la realizzazione di progetti extracurricolari per la scuola del primo e del secondo ciclo.	Istituti scolastici	800.000,00
2.3	Azione sperimentale di supporto all'alternanza scuola lavoro in Alta Irpinia.	Istituti scolastici	300.000,00
2.4	Botteghe di mestiere e di innovazione in Alta Irpinia.	Promotori di tirocini	237.000,00
2.5	Realizzazione di programmi formativi mirati all'accrescimento delle “competenze” dei giovani-torno subito in Alta Irpinia.	Organismi di formazione	250.000,00
			1.707.000,00

PSR

Per i 2 interventi, **Schede progetto 6.1 e 7.1**, si è conclusa la fase A di individuazione della strategia e del piano di investimenti, attualmente è in corso la fase B (bando chiuso a novembre 2022) relativa alla realizzazione degli investimenti definiti nella strategia.

APQ ALTA IRPINIA INTERVENTI FINANZIATI CON IL PSR			
N. SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	Beneficiario	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
6.1	Azienda forestale. Cooperazione per il supporto alla competitività delle filiere forestali attraverso la sperimentazione di una gestione partecipata del patrimonio forestale dell'Alta Irpinia.	FONDAZIONE MONTAGNE ITALIA	10.200.000,00
7.1	Partnership pubblico- privato per la cooperazione a supporto della filiera zootecnica e per la tutela e la valorizzazione dell'identità locale.	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	500.000,00
			10.700.000,00

AVANZAMENTO FINANZIARIO


I progetti attualmente in corso di attuazione sono 15, di cui 8 afferenti alla legge di stabilità e 7 ai Fondi SIE. Rispetto allo scorso anno la capacità di spesa complessiva è quasi raddoppiata, sia per i fondi che per la Legge di stabilità, passando dal 7,8% al 14,9%.

La performance della Legge di stabilità è piuttosto significativa, si registra infatti una capacità di spesa del 70% ed una capacità d'impegno del 71%.


Tab. 6- APQ ALTA IRPINIA: Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2022

AVANZAMENTO FINANZIARIO					
APQ ALTA IRPINIA	DOTAZIONE FINANZIARIA	IMPEGNI	PAGAMENTI	capacità di spesa %	capacità d'impegno%
LEGGE STABILITA'	3.740.000,00	2.654.467,61	2.581.157,97	69,0	71,0
FONDI SIE	25.635.073,90	9.032.068,30	1.800.189,20	7,0	35,2
TOTALE	29.375.073,90	11.686.535,91	4.381.347,17	14,9	39,8

Fonte: nostre elaborazioni su dati SURF

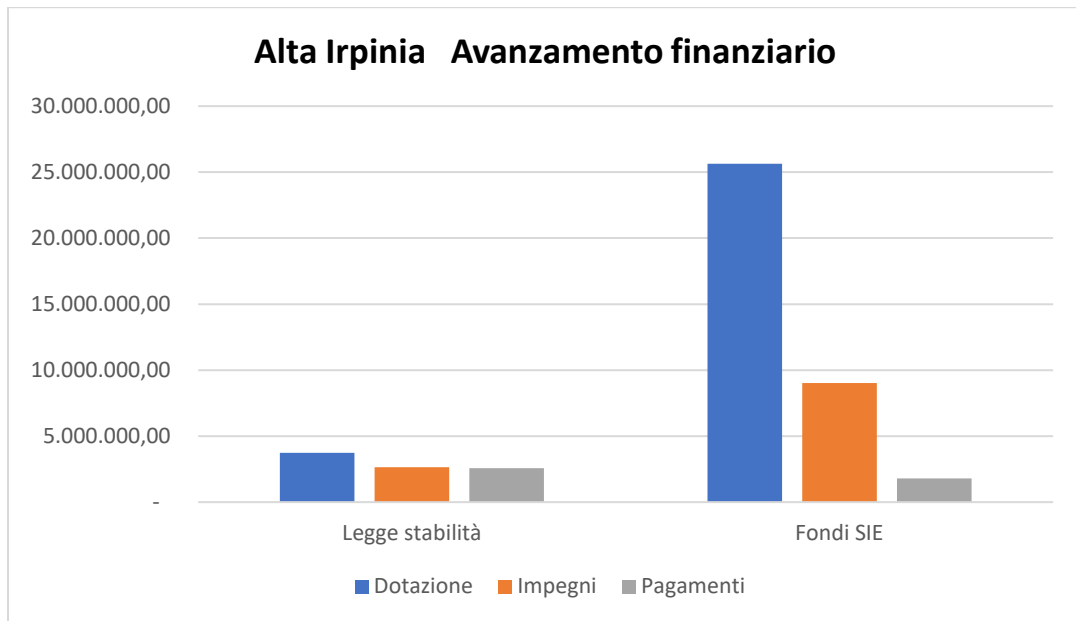


Alta Irpinia Pagamenti per fonte di finanziamento

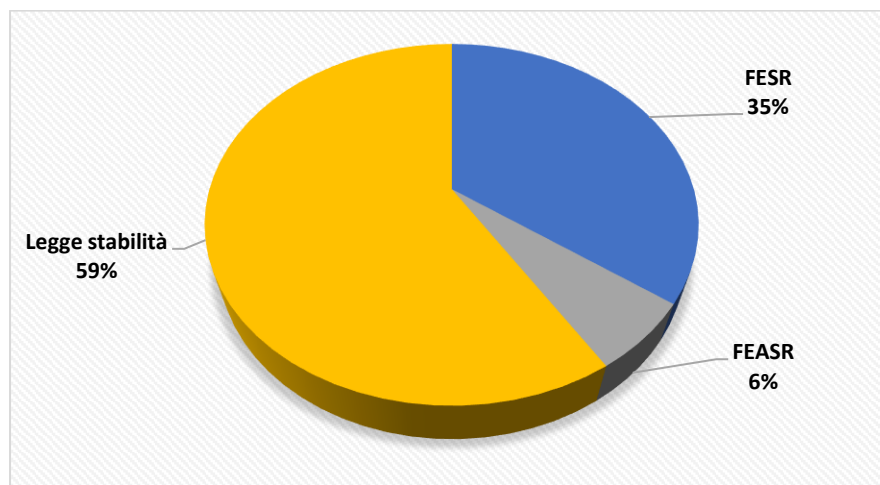

8. APQ VALLO DI DIANO: Riparto risorse e stato di attuazione degli interventi

I progetti approvati sono 21 per un ammontare di risorse destinate pari a € 17.703.369,00; oltre il 64% delle risorse (tab.7) è dedicato allo sviluppo locale, con interventi di promozione del patrimonio culturale, ambientale (FESR) ed al potenziamento dei sistemi produttivi territoriali (FEASR). Seguono in ordine decrescente di destinazione delle risorse, gli interventi per il “digital divide” (11%), per l’istruzione e la formazione (10%), per la salute (9%) e per la mobilità (5%).

Tab.7 Distribuzione Risorse per Settore di intervento

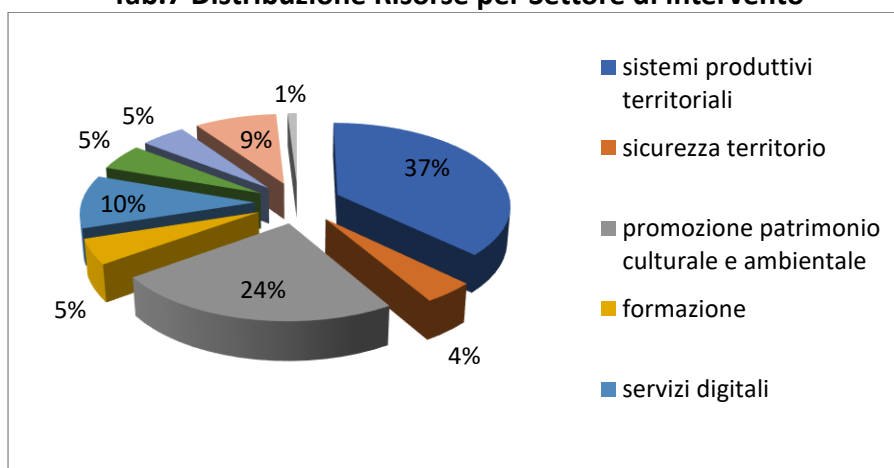

Gli interventi finanziati con la **Legge di stabilità** sono 9, di cui 2 in materia di salute, 3 dedicati al potenziamento della mobilità, 3 in materia di istruzione ed 1 all’assistenza tecnica. Il progetto 1.1 “Sistema Intercomunale permanente”, che ha come beneficiario la Comunità montana Vallo di Diano relativo all’assistenza tecnica è in corso di attuazione. Gli interventi sono disciplinati dalle Delibere CIPE mentre l’attuazione è regolata dal

APQ VALLO DI DIANO- LEGGE STABILITA' QUADRO DEGLI INTERVENTI				
N. SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro	SETTORE	BENEFICIARIO/ATTUATORE
1.1	Sistema Intercomunale Permanente	185.000,00	Assistenza Tecnica	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO
6.1	Fablab	320.000,00	Istruzione	Istituto Superiore M.T.Cicerone di Sala Consilina (SA)
7.1	Azioni di supporto specialistico a vantaggio dei bambini e ragazzi migranti e dei minori non accompagnati	192.800,00	Istruzione	Istituto Omnicomprensivo A. Sacco (SA) Teggiano
7.2	Azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base	464.200,00	Istruzione	Istituto Comprensivo di Padula (SA)
8.1	Razionalizzazione e riorganizzazione del TPL	60.000,00	Mobilità	PROVINCIA DI SALERNO
8.2	Messa in sicurezza fermate TPL	513.920,00	Mobilità	PROVINCIA DI SALERNO
8.3	Taxi Sociale	333.000,00	Mobilità	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO
9.1	Realizzazione di n.1 unità complessa di cure primarie e n.1 ospedale di comunità	1.100.000,00	Sanità	ASL SALERNO
9.2	Progetto obiettivo materno - infantile	551.400,00	Sanità	ASL SALERNO
		3.720.320,00 €		

“Disciplinare delle procedure per gli interventi dell’APQ Area Interna Vallo di Diano finanziati con Legge di Stabilità nazionale”, approvato con DD n.17 del 09.05.2019.

SALUTE

L’ASL di Salerno è il beneficiario dei 2 interventi entrambi in corso di attuazione:

Scheda progetto 9.1 “Realizzazione di una Unità complessa di cure primarie e un Ospedale di comunità” nell’ex ospedale di S. Arsenio, oggetto di riqualificazione.

Scheda progetto 9.2 “Progetto materno infantile” prevede l’attivazione di un Consultorio a Padula nella ex clinica Fischietti (a sua volta oggetto di riqualificazione e ammodernamento), un altro a Sant’Arsenio (condividendo con l’ospedale spazi, attrezzature e professionalità) ed infine l’adeguamento del Consultorio di Sala Consilina.

MOBILITÀ

Sono stati finanziati 3 interventi che hanno come soggetti attuatori la Comunità Montana del Vallo di Diano per l’intervento **Scheda progetto 8.3** e la Provincia di Salerno per gli interventi **Schede progetto 8.1** ed **8.2**.

Gli interventi sono tutti in corso di attuazione.

Scheda progetto 8.1 “Razionalizzazione e riorganizzazione TPL” risulta espletata procedura di gara ed affidato il servizio.

Scheda progetto 8.2 “Messa in sicurezza fermate TPL” risulta in corso la procedura di gara per l’affidamento.

Scheda progetto 8.3 “Servizio di taxi sociale” ha permesso a 425 utenti un agevole accesso ai servizi sociali e sanitari distrettuali, alle farmacie, ai centri di analisi e ai centri terapeutici. Nel complesso sono stati percorsi 40.220 Km nel periodo febbraio- dicembre 2022.

ISTRUZIONE

I tre interventi finanziati hanno come soggetti beneficiari l’Istituto Superiore M.T. Cicerone di Sala Consilina per il progetto 6.1, l’Istituto Omnicomprensivo A. Sacco di Teggiano con per il progetto 7.1 e l’Istituto Comprensivo di Padula per il progetto 7.2.

Scheda progetto 6.1 “FABLAB” beneficiario l’Istituto Superiore M.T. Cicerone comprensivo di Sala Consilina, è in corso di esecuzione.

Scheda progetto 7.1 “Azioni di supporto specialistico a vantaggio di bambini e ragazzi migranti e minori non accompagnati”, è concluso manca la rendicontazione finale.

Scheda progetto 7.2 “Azioni di Potenziamento delle aree disciplinari di base”, l’istituto di Padula ha completato tutti i 12 moduli relativi alla prima linea di intervento “Formazione Docenti”, per un numero complessivo di 720 ore e sono stati conclusi anche i moduli relativi alla seconda linea “Laboratori didattici”, dedicata agli alunni. Il progetto è concluso manca la rendicontazione finale.

FESR

Tra i 9 interventi previsti quelli in fase di attuazione sono:

Scheda progetto 1.2 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili”, per cui risulta sottoscritto il contratto per l’affidamento dei “servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa”);

Scheda progetto 1.3 “Un Territorio Sicuro” risulta l’aggiudicazione definitiva al RTI Leonardo SpA, Tech Tron SrL, Telecom Italia SpA, il contratto per l’esecuzione del servizio è stato sottoscritto il 09 settembre 2022;

Scheda progetto 2.1 “Destination Management Organization” con compiti di coordinamento del sistema turistico, risulta sottoscritto in data 16 dicembre 2021 il contratto per l’esecuzione del servizio;

Scheda progetto 2.2 “Promozione e marketing della destinazione turistica Vallo di Diano” il contratto per l’esecuzione del servizio è stato sottoscritto il 02 agosto 2022;

Scheda progetto 4.1” Atlante dei Saperi del Vallo di Diano e Poli della Memoria” Diano risulta sottoscritto il contratto per l’esecuzione del servizio.

Per l’intervento relativo alla **Scheda progetto 4.2** “Sviluppo di prodotti e servizi per la fruizione innovativa dei beni culturali e naturali”, con DD 972 del 16 dicembre 2022 è stato pubblicato l’avviso pubblico “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali delle Aree SNAI del Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro Titerno” (che coinvolge anche l’area Cilento Interno con l’intervento 5.2 “Ospitalità cilentana” e l’area Tammaro Titerno con l’intervento 10.5 “Sostegno alla nascita ed al consolidamento delle imprese -e/o di reti di imprese - di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori turistici territoriali”).

APQ VALLO DI DIANO: INTERVENTI FINANZIATI DAL FESR			
N. SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	BENEFICIARIO	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
1.2	Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pinamente interoperabili	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	1.952.000,00
1.3	Un Territorio Sicuro	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	800.000,00
2.1	Destination Management Organization con compiti di coordinamento del sistema turistico	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	268.400,00
2.2	Promozione e marketing della destinazione turistica Vallo di Diano	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	610.000,00
2.3	CLUB DI PRODOTTO “ Vallo di Diano”	REGIONE	900.000,00
3.1	Interventi di conservazione e di valorizzazione delle aree protette e degli habitat ricadenti nel Vallo di Diano	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	1.736.000,00
4.1	Atlante dei Saperi del Vallo di Diano e Poli della Memoria	COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO	646.600,00
4.2	Sviluppo di prodotti e servizi per la fruizione innovativa dei beni culturali e naturali	REGIONE	1.220.000,00
6.4	Sostegno all'innovazione tecnologica dei sistemi produttivi territoriali	REGIONE	1.220.000,00
			9.353.000,00

Sono invece in fase di riprogrammazione i seguenti interventi:

Scheda progetto 2.3 CLUB DI PRODOTTO “Vallo di Diano”;

Scheda progetto 3.1” Interventi di conservazione e di valorizzazione delle aree protette e degli habitat ricadenti nel Vallo di Diano”;

Scheda progetto 6.4 “Sostegno all'innovazione tecnologica dei sistemi produttivi territoriali”.

FSE

Gli interventi a valere sul FSE sono relativi alle **schede progetto 6.2 e 6.3**:

VALLO DI DIANO Interventi finanziati dal FSE			
N. SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	Beneficiario	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
6.2	Fablab - tutorship e qualificazione imprese	Istituto Superiore M.T.Cicerone di Sala Consilina (SA)	703.900,00
6.3	Azioni di formazione specialistica ed aggiornamento a supporto del corpo docente	Istituto omnicomprensivo di Padula C. Pisacane	226.149,00
			930.049,00

Scheda progetto 6.2 “Fablab - tutorship e qualificazione imprese” (Istituto Superiore di Sala Consilina) l’intervento è in corso di attuazione;

Scheda progetto 6.3 “Azioni di formazione specialistica ed aggiornamento a supporto del corpo docente” l’intervento è in fase di riprogrammazione.

PSR

Per l’unico intervento finanziato, **Scheda progetto 5.1** “Rural Hub” si è conclusa la fase A di individuazione della strategia e del piano di investimenti, attualmente in corso la fase B (bando chiuso a novembre 2022) per l’attuazione degli investimenti individuati con la fase A.


VALLO DI DIANO interventi finanziati con il PSR			
N. Scheda	INTERVENTO STRATEGICO	BENEFICIARIO	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
5.1	RURAL HUB	COMUNITA' MONTANA VDD	3.700.000

AVANZAMENTO FINANZIARIO


La capacità di spesa complessiva per i 17 progetti in corso di attuazione (di cui 9 afferenti alla legge di stabilità ed 8 ai Fondi SIE) risulta quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente, passando dal 3,7% al 7%. Resta comunque molto da fare per raggiungere gli obiettivi e concludere i progetti nei tempi previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Tab. 7- APQ VALLO DI DIANO: Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2022

VALLO DI DIANO	DOTAZIONE FINANZIARIA	AVANZAMENTO FINANZIARIO			
		IMPEGNI	PAGAMENTI	capacità di spesa	capacità d'impegno
		a	b	c/a	b/a
LEGGE STABILITA'	3.720.320,00	965.022,65	525.119,47	14,1	25,9
FONDI SIE	13.983.049,00	3.394.518,97	721.775,34	5,2	24,3
TOTALE	17.703.369,00	4.359.541,62	1.246.894,81	7,0	24,6

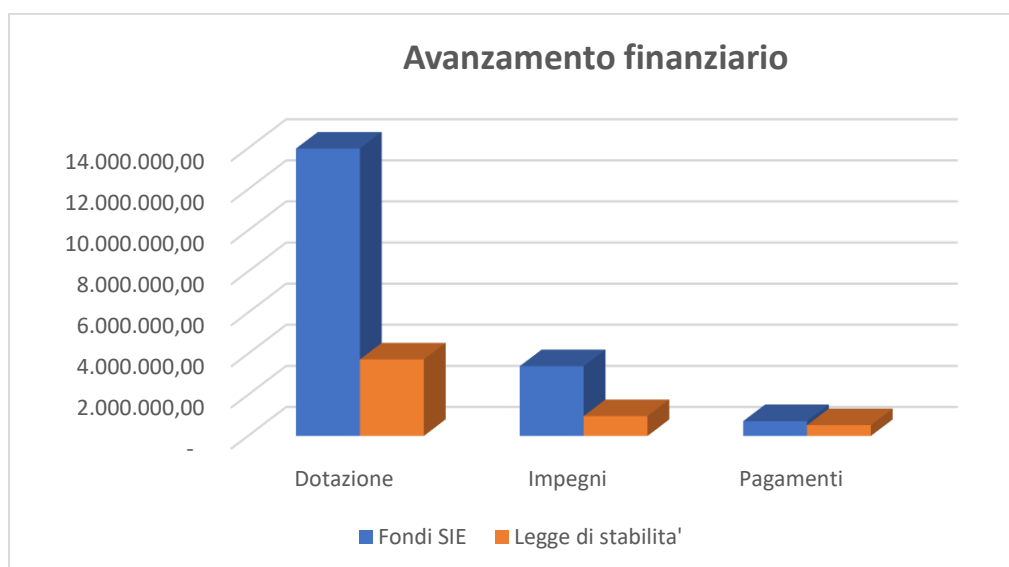

Distribuzione dei pagamenti per fonte di finanziamento

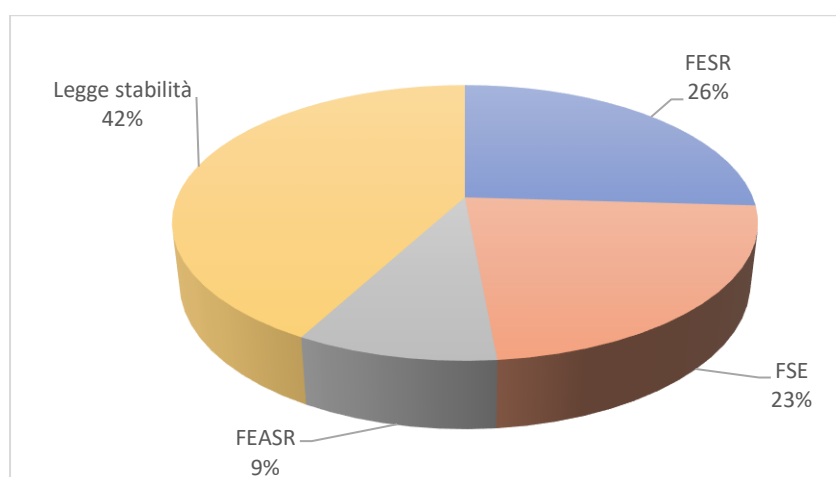


9. APQ TAMMARO TITERNO - Stato di attuazione degli interventi

I progetti individuati sono 29, per un importo pari a € 23.484.497,27 a valere sia sui fondi SIE che su quelli della Legge di Stabilità. La distribuzione delle risorse complessive per tipologia di settore, rappresentata nel grafico seguente, evidenzia che gli interventi a favore dei sistemi produttivi territoriali assorbono il 60% delle risorse. Seguono gli interventi volti alla promozione del patrimonio culturale e ambientale con finalità turistica con il 13%, quelli per i servizi digitali (10%), per la salute (8%), infine i restanti settori (formazione, istruzione, mobilità e assistenza tecnica) assorbono complessivamente il 9% dell'ammontare delle risorse.

Gli interventi a valere sulla Legge di stabilità sono 17 e sono disciplinati dalle Delibere CIPE² mentre l'attuazione è regolata dal "Disciplinare delle procedure per gli interventi dell'APQ Area Interna Tammaro Titerno finanziati con Legge di Stabilità nazionale" approvato con DD n.140 del 17.12.2021.

APQ Tammaro-Titerno: Distribuzione Risorse per Settore di intervento

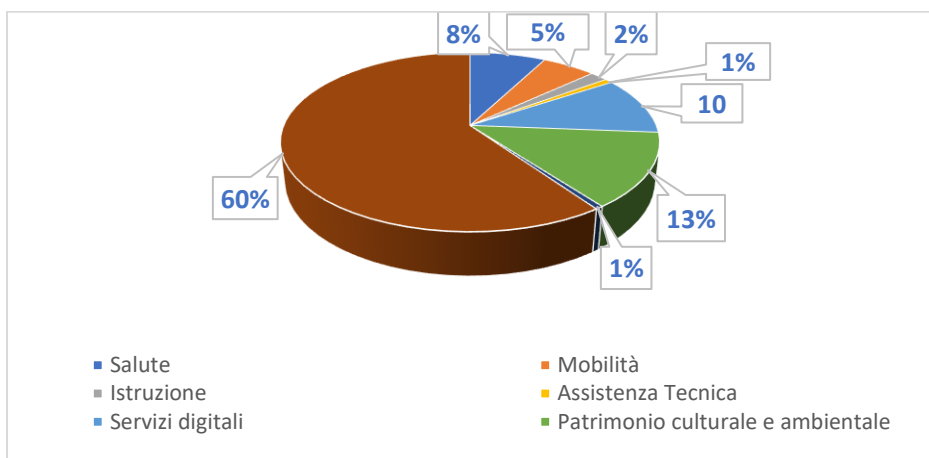

APQ TAMMARO TITERNO: LEGGE DI STABILITA' QUADRO DEGLI INTERVENTI.				
N. SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	DOTAZIONE FINANZIARIA IN EURO	SETTORE	BENEFICIARIO/ATTUATORE
1.2	Supporto specialistico all'attuazione della strategia d'area	186.904,00	Assistenza tecnica	Comune di S. Croce del Sannio
2.1	Formazione specialistica ed aggiornamento del corpo docenti	62.500,00	Istruzione	Istituto Istruzione Superiore "Telesi@"
2.2	Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche – Modulo linguistico "Inglese" per il secondo ciclo	72.000,00	Istruzione	Istituto Istruzione Superiore "Telesi@"
2.3	Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche – Modulo linguistico "English easy" per il primo ciclo	72.000,00	Istruzione	Istituto Comprensivo "Eduardo De Filippo" di Morcone
2.4	Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche "Running e Trekking culturale"	67.376,00	Istruzione	Istituto Istruzione Superiore "Telesi@"
2.5	Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche - Conoscenza del Patrimonio Culturale del proprio territorio: "Storie di lana"	54.000,00	Istruzione	Istituto Comprensivo "Eduardo De Filippo" di Morcone
2.6	Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche "Gioco-sport"	63.795,00	Istruzione	Istituto Comprensivo "Eduardo De Filippo" di Morcone

² Delibere CIPE n. 9 del 2015, n. 43 del 2016, n. 80 del 2017, n. 52 del 2018 e n. 72 del 2019 e ss.mm.ii

2.8	Acquisizione di competenze abilitanti in "Sistemista di Reti" – Modulo formativo per il secondo ciclo	36.000,00	Istruzione	Istituto Istruzione Superiore "Telesi@"
5.1	Studio di Mobilità dell'Area	86.500,00	Mobilità	Comune di Santa Croce del Sannio
5.2	Miglioramento della mobilità e del TPL attraverso strumenti di smart mobility	203.008,00	Mobilità	Comune di Santa Croce del Sannio
5.3	Taxi Sociale	260.000,00	Mobilità	Comune di Santa Croce del Sannio
5.4	Servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse locale: attivazione di n. 1+1 corse/fermate aggiuntive di treni metropolitani tratta Telese Cerreto – Napoli Centrale e Napoli Centrale – Telese Cerreto	751.080,00	Mobilità	Regione Campania
4.1	Terapia occupazionale	275.492,27	Salute	Comune di Santa Croce del Sannio
4.2	SMART Care – Servizi di Telemedicina - Sistema di Telemonitoraggio e Teleassistenza	485.640,00	Salute	Asl Benevento
4.3	Rete Farmacia dei servizi	111.752,00	Salute	Asl Benevento
4.4	Infermiere di comunità	767.000,00	Salute	Asl Benevento
4.5	Centro Diurno Specializzato in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) con valenza terapeutica, educativa e di socializzazione	198.960,00	Salute	Comune di Santa Croce del Sannio
TOTALE LEGGE STABILITA'				€ 3.754.007,27

SALUTE

L'ASL di Benevento e il Comune di Santa Croce del Sannio sono beneficiari di rispettivamente di 3 (Schede progetto 4.2, 4.3 e 4.4) e 2 (Schede progetto 4.1 e 4.5) interventi, solo quelli del Comune sono in corso di attuazione:

ASL Benevento

Scheda progetto 4.2 "Smart Care – Servizi di telemedicina – Sistema di telemonitoraggio e teleassistenza" che prevede la customizzazione di un sistema per il telemonitoraggio e televalutazione parametri vitali e lo sviluppo e la personalizzazione di un modulo per l'analisi del movimento e per la telemedicina riabilitativa, secondo i protocolli individuati dall'ASL BN, dell'anziano fragile in ricovero presso il Domicilio, le Residenze Sanitarie e l'Ospedale di Comunità della ASL Benevento.

Scheda progetto 4.3 "Rete Farmacia dei servizi" che intende promuovere un modello di sperimentazione in cui la Farmacia potrebbe offrire alla comunità locale prestazioni che altrimenti richiederebbero spostamenti non sempre agevoli, con costi anche elevati, in particolare per le persone anziane e sole.

Scheda progetto 4.4 "Infermiere di comunità" che intende promuovere un modello di sperimentazione che si inserisce in un più generale processo di riorganizzazione del SSN che prevede un decentramento dell'attività ospedaliera a favore di un potenziamento dei servizi sanitari territoriali e delle cure primarie.

Comune di Santa Croce del Sannio

Scheda progetto 4.1 “Terapia occupazionale” che vuole attivare un percorso di cura preventiva per gli anziani per fronteggiare problemi legati alla solitudine ed all’apatia e per favorire l’invecchiamento attivo.

Scheda progetto 4.5 “Centro Diurno Specializzato in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) con valenza terapeutica, educativa e di socializzazione” che prevede l’allestimento di un Centro Specializzato in Interventi Assistiti con Animali in cui verranno erogati interventi a valenza Terapeutica (TAA) e/o educativa (EAA) attraverso l’ausilio dell’animale in un contesto ambientale lontano dai centri urbani e fortemente incentrato nello spazio natura.

MOBILITA’

Sono stati finanziati 4 interventi che hanno come soggetti beneficiari il Comune di Santa Croce del Sannio per 3 interventi (Schede progetto 5.1, 5.2 e 5.3) e la Regione Campania per un intervento con la Scheda progetto 5.4, sono in corso di attuazione i progetti con beneficiario il Comune.

Comune di Santa Croce del Sannio

Scheda progetto 5.1 “studio di mobilità dell’area” che si pone l’obiettivo di indagare e verificare le condizioni per il miglioramento della mobilità all’interno dell’Area attraverso tre macro-attività: 1) Trasporto Pubblico Locale; 2) Infrastrutture.

Scheda progetto 5.2 “Miglioramento della mobilità e del TPL attraverso strumenti di smart mobility” che prevede una proposta di adozione e realizzazione di soluzioni di mobilità intelligente, al fine di migliorare e potenziare gli aspetti di mobilità interna all’Area, con particolare riferimento al TPL.

Scheda progetto 5.3 “Taxi sociale” che prevede un intervento sperimentale di trasporto a chiamata per assicurare agli abitanti dell’Area l’accessibilità ai servizi essenziali, ottimizzando, in tal modo, la quantità e qualità dei servizi legati alla salute ed alla mobilità.

Regione Campania DG Mobilità

Scheda progetto 5.4 “Servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse locale: attivazione di n. 1+1 corse/fermate aggiuntive di treni metropolitani tratta Telesse Cerreto – Napoli Centrale e Napoli Centrale – Telesse Cerreto” che prevede l’istituzione di n. 1 + 1 corse/fermate di treni metropolitani tratta Telesse Terme – Napoli Centrale e Napoli Centrale – Telesse Terme con una x partenza e una x rientro in fasce orarie compatibili con gli orari di apertura e chiusura di Uffici, studi professionali, esercizi commerciali, aziende, etc.

ISTRUZIONE

Gli interventi sono 7 ed hanno come soggetti attuatori gli istituti scolastici di Telesse (con 3 interventi) e Morcone (con 2 interventi), nessun progetto è stato avviato.

Istituto Istruzione Superiore "Telesi@"

Scheda progetto 2.1 “Formazione specialistica ed aggiornamento del corpo docenti” che prevede il **consolidamento** delle competenze digitali del personale scolastico, per la realizzazione di attività di Smart Teaching e didattica a distanza.

Scheda progetto 2.2 “Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche – Modulo linguistico “Inglese” per il secondo ciclo” che prevede il consolidamento ed il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading e writing) degli alunni delle scuole di istruzione superiore secondaria di II grado di tutta l’Area.

Scheda progetto 2.8 “Acquisizione di competenze abilitanti in “Sistemista di Reti” – Modulo formativo per il secondo ciclo” che ha lo scopo di attivare un Modulo formativo per preparare gli studenti al conseguimento della certificazione CISCO CCNA Routing and Switching (200-125).

Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” di Morcone

Scheda progetto 2.3 “Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche – Modulo linguistico “English easy” per il primo ciclo” che prevede un intervento formativo finalizzato all’innalzamento ed al rafforzamento delle competenze chiave, in particolare di quelle comunicative in lingua inglese, rivolto agli studenti delle scuole di istruzione secondaria di I grado di tutta l’Area.

Scheda progetto 2.4 “Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche “Running e Trekking culturale” che ha lo scopo di **agevolare** la diffusione della pratica sportiva tra le nuove generazioni.

Scheda progetto 2.5 “Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche - Conoscenza del Patrimonio Culturale del proprio territorio: “Storie di lana” che prevede un percorso formativo centrato sulla conoscenza del patrimonio ambientale, artistico, culturale e paesaggistico del proprio territorio.

Scheda progetto 2.6 “Acquisizione di competenze abilitanti in attività extra scolastiche “Gioco-sport” che prevede ha lo scopo prioritario di contrastare la dispersione scolastica.

FESR

Gli interventi previsti sono 8 e riguardano la gestione dei servizi digitali, lo sviluppo e la promozione dell’area ai fini turistici, sono interventi a regia regionale il cui attuatore è il Comune di Santa Croce del Sannio.

Gli 8 interventi sono in corso di attuazione.

TAMMARO TITERNO INTERVENTI FINANZIATI DAL FESR			
N. SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	BENEFICIARIO	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
1.1	Sannio Territorio Intelligente San.T.I.	Comune di Santa Croce	2.500.000,00
7.1	Piano di promozione e gestione per il recupero, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare urbano, ai fini di rigenerazione urbana e di attrazione di nuova residenzialità – Modello ed Azione Pilota	Comune di Santa Croce	555.100,00
9.3	Piano di valorizzazione per la riqualificazione/caratterizzazione della Fiera di Morcone come Fiera specializzata del settore Agricolo	Comune di Santa Croce	150.000,00
10.1	Piano di promozione e gestione per il recupero, la fruizione e la valorizzazione del Polo Turistico Montano del Matese – Modello ed Azione Pilota	Comune di Santa Croce	109.800,00
10.2	Piano di promozione e gestione per il recupero, la fruizione e la valorizzazione del Parco Ambientale del Tammaro – Modello ed Azione Pilota	Comune di Santa Croce	109.800,00
10.3	Piano di valorizzazione per il riuso di un immobile di particolare valore storico e culturale per fini di empowerment sociale-collettivo	Comune di Santa Croce	195.200,00
10.4	Destination Management Organization (DMO) e Piano di promozione e Comunicazione dell’Area	Comune di Santa Croce	520.940,00
10.5	Sostegno alla nascita ed al consolidamento delle imprese (e/o di reti di imprese) di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori turistici territoriali	Comune di Santa Croce	1.563.430,00
TOTALE			5.704.270,00

Scheda progetto 1.1 “Sannio Territorio Intelligente – San.T.I.”, ha l’obiettivo di attivare, nell’area di riferimento, la gestione associata dei servizi di Agenda Digitale Campania ed in particolare coordinare il lavoro dei RTD in modo da proporre agli organi competenti un piano di adeguamento dell’ Ente in ottemperanza degli obblighi normativi di legge, anche tramite forme associate di assistenza tecnica esterna attivata dalla Associazione Sannio Smart Land in grado di supportare il processo di migrazione degli Enti nell’era digitale, al contempo generando un sistema intelligente e connesso cui Cittadini, Operatori Pubblici e Privati, Studenti, terzi fruitori (turisti, visitatori, etc.) possono riferirsi per soddisfare la propria domanda di servizi on line e digitali;

Scheda progetto 7.1 “Piano di promozione e gestione per il recupero, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare urbano, ai fini di rigenerazione urbana e di attrazione di nuova residenzialità – Modello ed Azione Pilota”, propone la definizione di un percorso pilota per la costruzione di una nuova modalità di governance (nelle forme del PPP) per la ricognizione, mobilitazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato, integrandone la potenzialità di nuova fruizione entro policies locali (fiscali e procedurali e finanziarie) di vantaggio, finalizzate alla integrazione di spazi fisici disponibili e veicolabili su nuovi target di mercato, opportunamente sollecitati, con spazi sociali, spazi economici e spazi ambientali, al fine di generare un’offerta attrattiva;

Scheda progetto 9.3 “Piano di valorizzazione per la riqualificazione della Fiera di Morcone”, propone la realizzazione di un programma di intervento per valutare la possibile ri-configurazione e ri-definizione del modello fieristico sin qui consolidato in una chiave re-interpretativa che possa condurre alla strutturazione di una nuova identità di contenuti, di immagine e di posizionamento della Fiera stessa;

Scheda progetto 10.1 “Piano di promozione e gestione per il recupero, la fruizione e la valorizzazione del Polo Turistico Montano del Matese – Modello ed Azione Pilota” è finalizzato alla verifica delle condizioni per un potenziamento e sviluppo della località sciistica di Bocca della Selva e del territorio circostante, attraverso una serie di interventi di carattere infrastrutturale e strutturale per lo svolgimento di svariate attività invernali ed estive;

Scheda progetto 10.2 “Piano di promozione e gestione per il recupero, la fruizione e la valorizzazione del Parco Ambientale del Tammaro – Modello ed Azione Pilota” disegna un percorso di verifica per la realizzazione di un Parco Territoriale diffuso sul territorio, con perno nel Comune di Pietrelcina, caratterizzato da due componenti fondamentali: una costituita dal fiume Tammaro e dai suoi affluenti, l’altra costituita dalla morfologia del territorio urbanizzato e del paesaggio agrario;

Scheda progetto 10.3 “Interventi per il riuso a fini turistici di edifici e/o infrastrutture di particolare valore storico e culturale, da rifunzionalizzare per fini turistici. Piano di sviluppo di un modello innovativo di riconversione, offerta e governante del patrimonio immobiliare urbano per finalità turistico-ricettive e per nuova residenzialità” si propone l’individuazione di uno o più immobili di pregio storico (ex conventi, ex seminari, palazzi gentilizi, etc..) che abbiano dismesso le loro precedenti funzionalità e possano essere utilizzati, previo un adeguato intervento di rifunzionalizzazione, per obiettivi e finalità di empowerment generale della collettività;

Scheda progetto 10.4 “Piano strutturazione DMO e Piano di promozione e comunicazione dell’Area” affronta il tema progettuale della costituzione di una Destination Management Organization (D.M.O.), finalizzata ad assemblare, promuovere e commercializzare prodotti turistici basati su un equilibrato mix di risorse e servizi turistici di supporto (Servizi di informazione, Servizi di booking centralizzato, organizzazione logistica di eventi e meeting; fornitura di itinerari turistici; fornitura di soluzioni ideali per programmi sociali, culturali e sportivi; customer satisfaction);

Scheda progetto 10.5 “Sostegno alla nascita ed al consolidamento delle imprese (e/o di reti di imprese) di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori turistici territoriali” si concretizza in un Regime di aiuti per favorire la crescita e sostenere le imprese operanti nell’ambito del turismo, attraverso il sostegno alla realizzazione di 49 interventi materiali ed immateriali di sviluppo integrato del tessuto

imprenditoriale esistente. L'intenzione strategica è, essenzialmente, rivolta ad incoraggiare l'orientamento all'innovazione e all'innalzamento qualitativo dei prodotti e dei servizi turistici;

FSE

I due interventi previsti (Schede progetto 2.7 e 3.1) anno come soggetti attuatori rispettivamente il Comune di Santacroce e l'Istituto Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" sez. Guardia Sanframondi.

Per entrambi gli interventi è prevista la riprogrammazione per il periodo 21-27.

TAMMARO TITERNO INTERVENTI FINANZIATI DAL FSE			
SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	BENEFICIARIO	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
2.7	Educazione antifragile	Comune di Santa Croce	95.400,00
3.1	Potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) attraverso la collaborazione tra scuola e filiere produttive locali con particolare riferimento alla filiera vitivinicola	Istituto Istruzione Superiore "Galilei-Vetrone" sez. Guardia Sanframondi	41.720,00
TOTALE			137.120,00

Scheda progetto 2.7 "Educazione antifragile", propone di realizzare la sperimentazione per un anno scolastico di percorsi didattici innovativi per l'infanzia (0-6 anni) con un prototipo attraverso attività di ricerca-azione e attraverso l'applicazione di un approccio multidisciplinare.

Scheda progetto 3.1 "Potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) attraverso la collaborazione tra scuola e filiere produttive locali con particolare riferimento alla filiera vitivinicola" si propone di generare un processo virtuoso di osmosi tra l'imprenditoria locale e la scuola dove si acquisiscono le competenze tecnico-sperimentali necessarie a promuovere l'innovazione di processo e di prodotto di cui l'economia dell'Area ha bisogno per competere.

PSR

I due interventi previsti (Schede progetto 8.1 e 9.1) riguardano la valorizzazione delle filiere forestale e zootecnica, per entrambi è in corso la fase A finalizzata alla costituzione di un partenariato ed alla elaborazione di una strategia di sviluppo che contempili gli investimenti da attuare nella fase B.

TAMMARO TITERNO INTERVENTI FINANZIATI DAL PSR			
SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	BENEFICIARIO (Fase A)	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
8.1	Valorizzazione Filiera Forestale	Comune di Santa Croce del Sannio	10.189.100,00
9.1	Valorizzazione Filiera Zootecnica	Comune di Santa Croce del Sannio	3.700.000,00
TOTALE			13.889.100,00

Scheda progetto 8.1 "Valorizzazione Filiera Forestale", propone L'Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato formalizzato per la valorizzazione della filiera forestale dell'Area utile alla definizione ed implementazione di un Piano Integrato di Valorizzazione della Filiera Forestale dell'Area a cui farà seguito l'attivazione di Piano/i di Impresa finalizzati alla attuazione del Piano.

Scheda progetto 9.1 "Valorizzazione Filiera Zootecnica", si propone l'attivazione di un Partenariato Pubblico Privato formalizzato per la valorizzazione della filiera zootecnica dell'Area utile alla definizione ed implementazione di Piano/i di Impresa finalizzati allo scopo.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

I pagamenti (Tab.8) relativamente ai 16 progetti in corso di attuazione (6 afferenti alla legge di stabilità e 10 ai Fondi SIE) riguardano le risorse erogate a titolo di anticipazione che ammontano a circa 650 mila euro.


La capacità di spesa si attesta al 14%.

Il ritardo nell'avanzamento finanziario è imputabile approvazione dell'APQ che è avvenuta solo a dicembre 2021.


Tab. 8- APQ TAMMARO TITERNO: Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2022

TAMMARO TITERNO	DOTAZIONE	AVANZAMENTO FINANZIARIO			
		IMPEGNI	PAGAMENTI	capacità di spesa in %	capacità d'impegno in %
LEGGE STABILITA'	3.754.007,27	484.345,71	484.345,71	12,90	12,90
FONDI SIE	19.730.490,00	1.640.840,00	164.084,00	0,83	8,32
TOTALE	23.484.497,27	2.125.185,71	648.429,71	13,73	21,22

Fonte: Ns elaborazioni su dati SURF

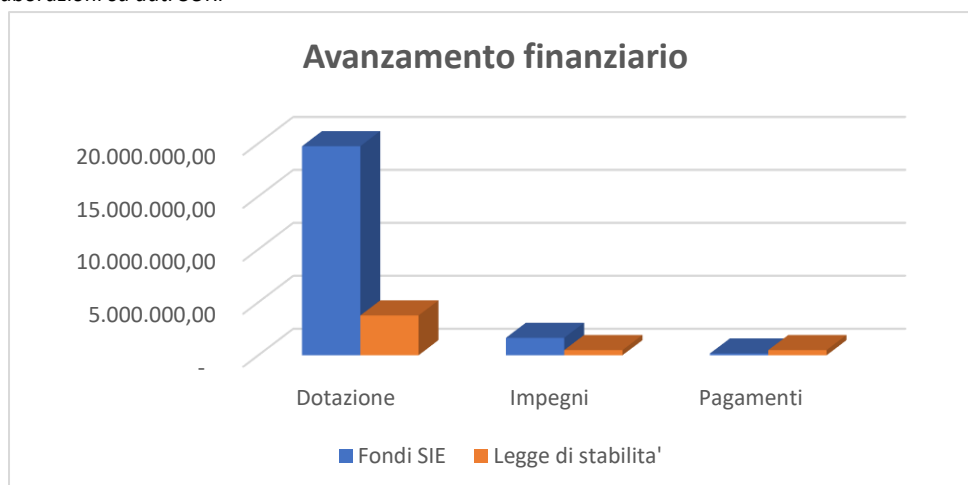


Distribuzione dei pagamenti per fonte di finanziamento



10. APQ CILENTO INTERNO - Stato di attuazione degli interventi

I progetti individuati sono 22, per un importo pari a € 15.077.280,00 a valere sia sui fondi SIE che su quelli della Legge di Stabilità. La distribuzione delle risorse complessive per tipologia di settore, rappresentata nel grafico seguente, evidenzia che gli interventi a favore del settore turistico e dell'artigianato assorbono il 30% delle risorse. Seguono gli interventi volti allo sviluppo dei sistemi produttivi territoriali con il 24%, quelli per i servizi digitali (16%), per la salute (11%), per la mobilità (8%) infine i restanti settori (formazione, istruzione, energia e assistenza tecnica) assorbono complessivamente il 11% dell'ammontare delle risorse.

APQ Cilento-Interno Distribuzione Risorse per Settore di intervento

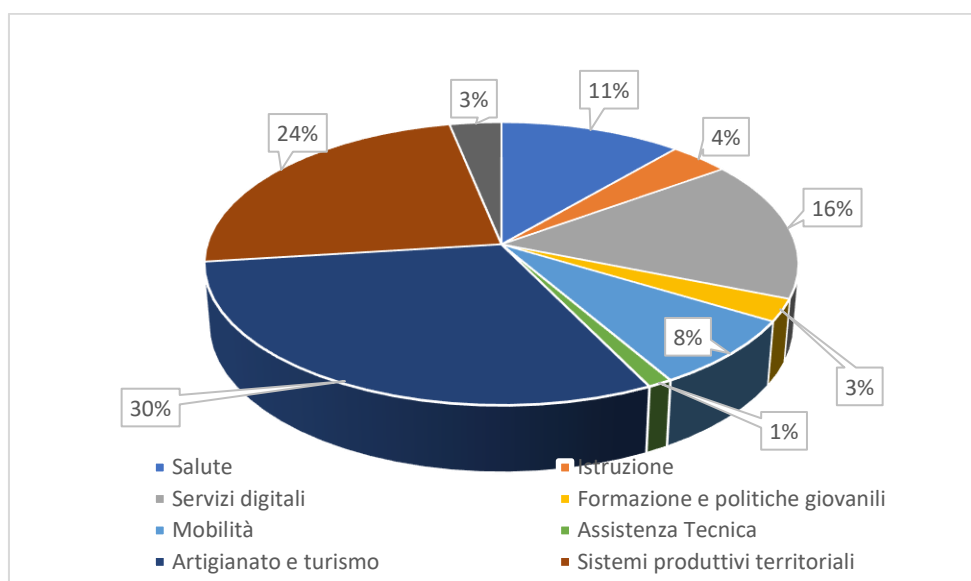

Gli 11 interventi a valere sulla Legge di stabilità, disciplinati dalle Delibere CIPE³, sono tutti in corso di attuazione. Il "Disciplinare delle procedure per gli interventi dell'APQ Area Interna Cilento interno finanziati con Legge di Stabilità nazionale", approvato con DD n.141 del 17.12.2021 regola le modalità di attuazione degli interventi.

APQ CILENTO INTERNO – INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE DI STABILITA'				
SCHEDA	PROGETTO	DOTAZIONE FINANZIARIA In euro	SETTORE D'INTERVENTO	BENEFICIARIO ATTUATORE
1.1	SISTEMA INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	184.000,00	ASSISTENZA TECNICA	Comune di Roccadaspide
2.3	TUTTI A DIETA!	220.000,00	SALUTE	ASL Salerno
6.1	INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ	662.000,00	SALUTE	ASL Salerno

³ Delibere CIPE n. 9 del 2015, n. 43 del 2016, n. 80 del 2017, n. 52 del 2018 e n. 72 del 2019 e ss.mm.ii

6.4	IMPLEMENTAZIONE RETE FARMACIE DI COMUNITA'	504.000,00	SALUTE	ASL Salerno
6.5	INCENTIVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA	372.000,00	SALUTE	ASL Salerno
7.1	LABORATORI PER UN PONTE TRA SCUOLA E LAVORO	234.728,00	ISTRUZIONE	IIS "Parmenide" di Roccadaspide
7.2	AZIONI DI SUPPORTO SPECIALISTICO A VANTAGGIO DEI BAMBINI E RAGAZZI MIGRANTI	185.000,00	ISTRUZIONE	I C di Roccadaspide
7.3	SCUOLE APERTE	165.128,00	ISTRUZIONE	I C di Roccadaspide
8.1	ANALISI E PIANIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI MINIMI DI TPL	40.000,00	MOBILITA'	Provincia Salerno
8.2	RAZIONALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DI TPL MINIMI	624.000,00	MOBILITA'	Provincia Salerno
8.3	RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TPL MINIMI	569.144,00	MOBILITA'	Provincia Salerno
TOTALE		3.760.000,00		

SALUTE

I 4 **progetti** previsti (Schede progetto 2.3, 6.1, 6.4 e 6.5) hanno come beneficiario l'ASL di Salerno:

Scheda progetto 2.3 "TUTTI A DIETA" si propone di accrescere l'impatto positivo dello stile di vita mediterraneo sul benessere della popolazione, in connessione con il driver istruzione: educazione alimentare per le nuove generazioni, creazione di menù e ricette adatte a migliorare le conoscenze e la conseguente adozione della Dieta Mediterranea, dei Prodotti tipici e della Resilienza Mediterranea;

Scheda progetto 6.1 "INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ" mira al rafforzamento dei servizi di assistenza territoriale attraverso l'istituzione dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità che svolge l'attività anche a domicilio della persona e della sua famiglia, e che ha funzione di raccordo tra l'anziano e/o il malato cronico e la rete dei diversi professionisti della sanità, al fine di migliorare la loro qualità di vita e diminuire i casi di cronicizzazione e ospedalizzazione;

Scheda progetto 6.4 "IMPLEMENTAZIONE RETE FARMACIE DI COMUNITA'" sostiene il ruolo delle farmacie nei piccoli centri che possono assicurare anche interventi di prima assistenza e, a seguito di quanto previsto dalla normativa sulla Farmacia dei servizi (d.lgs. n.153/2009), possono espletare anche nuove prestazioni di forte valenza sociale e sanitaria;

Scheda progetto 6.5 "INCENTIVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA" è finalizzato, di concerto con MMG e PLS presenti sul territorio, allo studio e finanziamento di forme di incentivazione e miglioramento dell'assistenza sanitaria di base nel territorio al fine di riorganizzare e/o aumentare il numero dei giorni di apertura degli studi già presenti sul territorio ed il numero degli studi dei MMG e PLS, anche attraverso forme organizzative mono professionali.

ISTRUZIONE

I 3 interventi previsti hanno come soggetti attuatori gli istituti scolastici di Roccadaspide.

Istituto d'Istruzione Superiore "Parmenide" di Roccadaspide

Scheda progetto 7.1 "Laboratori per un ponte tra scuola e lavoro" si propone di promuovere la scuola come un punto di riferimento formativo e di aggregazione sociale tramite cui creare opportunità di crescita personale e professionale e promuovere lo sviluppo imprenditoriale ed economico del territorio.

Istituto Comprensivo di Roccadaspide

Scheda progetto 7.2 “Azioni di supporto specialistico a vantaggio dei bambini e ragazzi migranti e dei minori non accompagnati” si propone il miglioramento dei servizi formativi per l’intero primo ciclo di istruzione e prevede il supporto specialistico a vantaggio di tutti i bambini e ragazzi per favorire l’integrazione e l’inclusione. Il progetto si pone come obiettivo principale la tutela e l’integrazione dei minori stranieri attraverso incontri, esperienze ed attività atte a sensibilizzare l’argomento creando anche occasioni di interazione e confronto tra le ragazze e i ragazzi delle **scuole**.

Scheda progetto 7.3 “SCUOLE APERTE” propone la sperimentazione in 5 comuni contermini dell’eliminazione delle pluriclassi con l’accorpamento in 3 classi di scuola dell’infanzia e 5 della primaria in uno dei comuni con la razionalizza l’utilizzo del personale attualmente in organico e il riutilizzo delle sedi non più utilizzate per attività integrative pomeridiane.

MOBILITA’

La Provincia di Salerno è il soggetto attuatore dei **3 progetti** (Schede progetto 8.1, 8.2 ed 8.3) di pianificazione e razionalizzazione dei servizi minimi di TPL :

Scheda progetto 8.1 “ANALISI E PIANIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI MINIMI DI TPL” affronta l’esigenza di razionalizzare le informazioni sulle tratte di percorrenza, sugli orari, sulle fermate non essendoci un quadro informativo unitario, accessibile e razionalizzato.

Schede progetto 8.2 - 8.3 “INFRASTRUTTURE E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TPL MINIMI” garantisce il miglioramento dell’accessibilità nelle porzioni di territorio più isolate dell’area pilota integrando il servizio di TPL esistente attraverso il potenziamento delle flotte con nuovi mezzi eco-compatibili, la realizzazione di 2 hub trasportistici e la realizzazione di un sistema di gestione con software finalizzato alla creazione di una piattaforma di gestione del servizio.

ASSISTENZA TECNICA

La scheda progetto 1.1 **“Sistema Intercomunale permanente”**, riguarda l’assistenza tecnica ed ha come soggetto capofila/beneficiario il Comune di Roccadaspide è in corso di attuazione ed ha l’obiettivo di supportare garantire supporto a gestione, monitoraggio e sorveglianza nell’attuazione della strategia a beneficio di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei progetti a vario titolo.

FESR

I 7 interventi programmati sono in corso di attuazione:

APQ CILENTO INTERNO: PROGETTI FINANZIATI DAL FESR			
SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	BENEFICIARIO	DOTAZIONE FINANZIARIA In euro
1.2	SERVIZI DIGITALI PER LA P.A.	Comune di Roccadaspide	1.628.000,00
4.1	ARTIGIANI INNOVATORI	Regione Campania	1.500.000,00
4.2	COOPERATIVE DI COMUNITÀ	Regione Campania	800.000,00
5.1	CIRCUITI CILENTANI	Comune di Roccadaspide	520.000,00
5.2	L’OSPITALITA’ CILENTANA	Regione Campania	1.000.000,00
5.3	CLUB DI PRODOTTO	Regione Campania	900.000,00
6.2	SERVIZI DIGITALI PER LA SALUTE DEI CILENTANI	Regione Campania	872.000,00
TOTALE			7.720.000,00

Scheda progetto 1.2 “Servizi digitali per la p.a.” Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili che concorrono positivamente al raggiungimento degli obiettivi della Strategia;

Scheda progetto 4.1 “ARTIGIANI INNOVATORI Salvaguardare antichi mestieri valorizzandoli con l’arte e l’innovazione”. Ha come scopo la rivitalizzazione e la creazione di nuove attività economiche nei territori del Cilento interno, recuperando gli antichi mestieri e tradizioni e agevolando la stabilizzazione delle attività già esistenti;

Scheda progetto 4.2 “Creazione di cooperative di comunità” finalizzato alla creazione di cooperative di comunità nei settori gestione cohousing x anziani altri servizi sociali, a coltivazione terre incolte e altre attività per migranti ;

Scheda progetto 5.1 “Circuiti Cilentani” per il recupero e la valorizzazione degli itinerari storico-naturalistici, al fine di consentire una fruizione sicura e lo sviluppo di un turismo di nicchia dedicato al trekking e all’escursionismo;

Scheda progetto 5.2 “L’ospitalità cilentana” per fornire supporto allo sviluppo di prodotti e servizi **complementari** alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici;

Scheda progetto 5.3 “Club di Territorio” per il sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (club di prodotto) per la produzione e distribuzione di prodotti integrati di destinazione anche attraverso la costruzione e promozione di itinerari;

Scheda progetto 6.2 “Infermiere di famiglia e di comunità: I nuovi protagonisti della sanità territoriale”. Nel processo di riorganizzazione del sistema sanitario nazionale, a fronte di un decentramento dell’attività ospedaliera a favore di un potenziamento dei servizi sanitari territoriali e delle cure primarie, l’introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità che, in collaborazione con le altre professionalità necessarie allo svolgimento degli interventi multidimensionali già presenti sul territorio (nutrizionisti, esperti in scienze motorie, psicologi, sociologi, esperti itc), e a supporto dell’attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei Distretti sanitari, costituirà una soluzione efficace per garantire la continuità assistenziale e l’integrazione socio-sanitaria.

FSE

Gli interventi individuati sono 2:

Scheda 6.3 Corso di aggiornamento in ITC per le professioni sanitarie finanzia la realizzazione di un percorso di aggiornamento formativo sulle competenze digitali rivolto ai neo – IF e C. A, a supporto dello sviluppo del nuovo modello organizzativo assistenziale e prevede uno specifico percorso articolato per moduli con l’obiettivo di fornire conoscenze sugli strumenti innovativi e i temi specifici legati alla sanità digitale.

Scheda 2.2 Home Restaurant intende promuovere lo stile di vita della Dieta mediterranea attraverso gli Home Restaurant, una iniziativa di innovazione sociale che incentiva una forma di turismo esperienziale e lento in cui è fondamentale l’esperienza multisensoriale e l’interazione con la comunità ospitante offrendo l’opportunità ai visitatori di confrontarsi con la cultura culinaria della DM in una dimensione casalinga, entrambi saranno riprogrammati nel periodo 21-27.

CILENTO INTERNO INTERVENTI FINANZIATI DAL FSE			
SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	ATTUATORE	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
2.2	Home restaurant	Regione Campania	231.280,00
6.3	Corso di aggiornamento in itc per le professioni sanitarie	Regione Campania	166.000,00
Totale			397.280,00

PSR

I progetti individuati **sono due**:

Scheda 2.1 “Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - paniere mediterraneo”, finalizzato al consolidamento della rete tra imprese per la creazione di una filiera della “dieta mediterranea”. L’intervento consiste nella creazione di una economia di sistema che valorizzi le microeconomie locali, in un’ottica di salvaguardia del territorio e di sviluppo locale. • FASE A: costituzione di partenariati per l’elaborazione di una proposta di progetto con il relativo piano di interventi definito nell’ambito o negli ambiti prescelti tra quelli individuati dalla presente tipologia di intervento; • FASE B: l’operatività dei partenariati e la realizzazione dei progetti elaborati nella precedente azione

Scheda 3.1 “Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo – il bosco come risorsa” è finalizzato alla realizzazione di un sistema che faciliti la gestione associata delle proprietà forestali tramite un sistema di accordi e costituzione di un’azienda territoriale per sviluppare in modo sostenibile la risorsa bosco e la filiera legno e, nel contempo, migliorare la qualità dei prodotti FASE A: costituzione di partenariati per l’elaborazione di una proposta di progetto con il relativo piano di interventi definito nell’ambito o negli ambiti prescelti tra quelli individuati dalla presente tipologia di intervento; FASE B: l’operatività dei partenariati e la realizzazione dei progetti elaborati nella precedente azione.

CILENTO INTERNO INTERVENTI FINANZIATI DAL PSR			
SCHEDA	INTERVENTO STRATEGICO	ATTUATORE	DOTAZIONE FINANZIARIA in euro
2.1	PANIERE MEDITERRANEO	Regione Campania	1.850.000,00
3.1	BOSCO COME RISORSA	Regione Campania	1.850.000,00
Totale			3.700.000,00

Per entrambi gli interventi è in corso la fase A, il cui bando è chiuso a novembre 2022, finalizzata alla costituzione di un partenariato ed alla elaborazione di una strategia di sviluppo che contempla gli investimenti da realizzare con la fase B.


AVANZAMENTO FINANZIARIO

I pagamenti relativi ai 17 progetti in corso di attuazione, di cui 11 afferenti alla legge di stabilità e 6 ai Fondi SIE riguardano le anticipazioni erogate per un totale di circa 1,55 mila euro. La capacità di spesa è del 10% con un ritardo ascrivibile essenzialmente all’approvazione dell’APQ nel dicembre 2021.


Tab. 9 - APQ CILENTO INTERNO: Avanzamento finanziario al 31 dicembre 2022

CILENTO INTERNO	DOTAZIONE in euro	AVANZAMENTO FINANZIARIO			
		IMPEGNI in euro	PAGAMENTI in euro	capacità di spesa in %	capacità d'impegno in %
LEGGE STABILITA'	3.760.000,00	1.445.318,00	1.445.318,00	38,44	38,44
FONDI SIE	11.317.280,00	629.895,00	110.099,99	0,97	5,57
TOTALE	15.077.280,00	2.075.213,00	1.555.417,99	10,32	13,76

Fonte: Ns elaborazioni su dati SURF

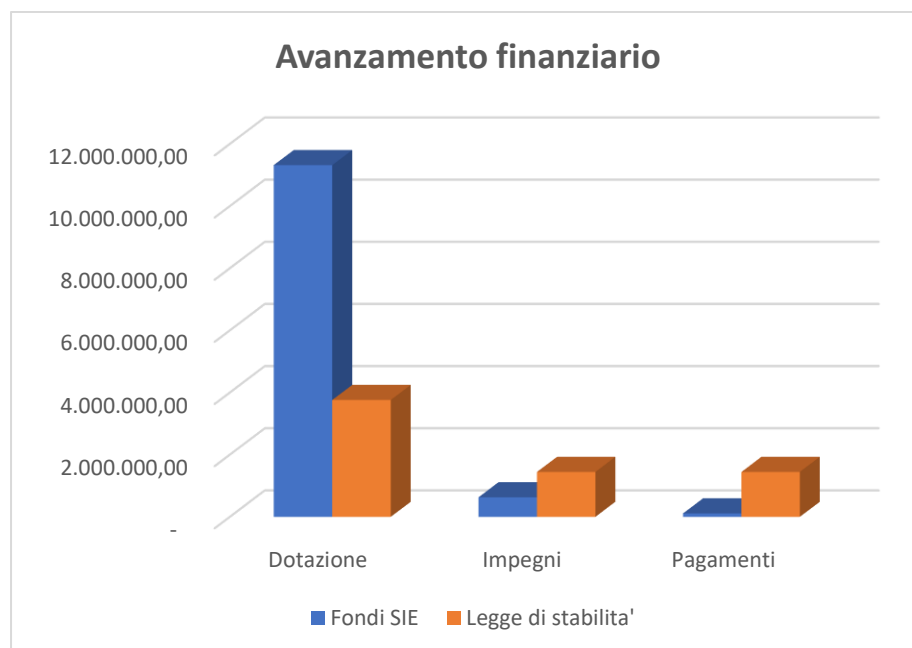

Distribuzione dei pagamenti per fonte di finanziamento



11. Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi nelle aree interne. DLgs n. 120/2021

In attuazione del DLgs n. 120 dell'8 settembre 2021 che destina risorse in favore degli enti territoriali per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi con DGR 311 del 21 giugno 2022, sono state ripartite alle Aree Interne della Campania le risorse pari € 2.211.112,00 assegnate con delibera CIPES 8/2022. Tali risorse sono destinate agli 11 progetti selezionati per l'acquisto di uno o più mezzi per sorveglianza armata dotati di modulo AIB e per l'acquisto ulteriori automezzi. I pagamenti relativi agli 11 progetti sono in corso di attuazione e riguardano le anticipazioni erogate per un totale di circa 885 mila euro corrispondenti al 40% dell'intero finanziamento.

Tab. 10 – Interventi prevenzione incendi boschivi: Avanzamento al 31 dicembre 2022

Interventi prevenzione incendi boschivi				
Ente attuatore		Area interna	Importo assegnato in euro	Anticipazione 40% in euro
1	Comunità Montana Alta Irpinia	Alta Irpinia	303.280,00	121.312,00
2	Comunità Montana Terminio Cervialto		228.280,00	91.312,00
3	Provincia di Avellino		78.280,00	31.312,00
TOTALE			609.840,00	243.936,00
4	Comunità Montana Alburni	Cilento interno	228.280,00	91.312,00
5	Comunità Montana Calore Salernitano		303.280,00	121.312,00
6	Comunità Montana Gelbison e Cervati		228.280,00	91.312,00
7	Provincia di Salerno		78.280,00	31.312,00
TOTALE			838.120,00	335.248,00
8	Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro	Tammaro - Titerno	228.280,00	91.312,00
9	Comunità Montana Taburno		78.280,00	31.312,00
10	Provincia di Benevento		78.312,00	31.324,80
TOTALE			384.872,00	153.948,80
11	Comunità Montana Vallo di Diano	Vallo di Diano	378.280,00	151.312,00
TOTALE COMPLESSIVO			2.211.112,00	884.444,80

12. CRITICITÀ E SUCCESSI

Lo stato di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne in Campania al 31 dicembre 2022 evidenzia una complessità di fondo che caratterizza i processi di definizione ed attuazione della SNAI, ciononostante la performance degli interventi a valere sulla Legge di Stabilità, in particolare per l'area pilota Alta Irpinia, è stata riconosciuta come *best practice* per la Regione Campania a livello nazionale anche con la presentazione, nel corso della Riunione Annuale di Riesame del 2019, del « *Progetto speciale unità per l'accoglienza permanente dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza (SUAP)*» di Bisaccia un progetto da € 1.035.851,87 che si è concluso intervenendo su una struttura di 600 mq e con la realizzazione di 10 posti letto.

Lo stesso progetto insieme al «*Progetto di Teleradiologia: realizzazione di una rete informatica ospedaliera*» del valore di 130.000 euro, sulla sperimentazione dei cosiddetti servizi essenziali a distanza, sono stati presentati nel corso della riunione del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) nel luglio 2020.

La seconda area pilota “Vallo di Diano” grazie anche alla presenza della Comunità Montana come soggetto capofila, forte di una notevole esperienza maturata in tema di delega di funzioni associate e del suo ruolo di ente sovracomunale, si sta caratterizzando per importanti risultati nell'attuazione degli interventi.

Le criticità principali della SNAI in Campania sono invece riconducibili sia ai tempi di definizione della Strategie d'area e dai conseguenti tempi occorsi per il perfezionamento degli APQ da parte dei soggetti coinvolti (tab 2, pag.5), sia alla complessità delle funzioni di coordinamento monitoraggio e alle difficoltà per i molteplici soggetti attuatori, caratterizzati da una elevata frammentazione e una ridotta dimensione organizzativa, nel produrre celermente una progettazione adeguata e cantierabile e nel dare attuazione alla stessa nel rispetto dei cronoprogrammi stabiliti.

13. CONCLUSIONI

Le fasi che caratterizzano il percorso di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne costituiscono un processo fortemente partecipativo che, partendo dai bisogni e dalle risorse dei territori, permette la costruzione di una strategia in cui confluiscono l'azione nazionale e quella locale. La diffusione dei risultati raggiunti favorisce, a sua volta, la promozione delle buone pratiche individuate a fungere da esempio, sia nei successi che nelle criticità, per gli attuatori di interventi simili.

Con la programmazione strategica del ciclo 2021 2027 è stato ribadito il ruolo della SNAI quale principale inquadramento strategico di riferimento per il sostegno alle aree non urbane e, nel febbraio 2022, è stato pubblicato un aggiornamento della Mappa delle Aree interne.

L'attenzione per le Aree interne è confermata anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede investimenti per 825 milioni di euro per potenziare servizi e infrastrutture sociali in aree sprovviste dei servizi sanitari di prossimità. È previsto un ulteriore specifico

stanziamento di 300 milioni di euro sul Fondo complementare per migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade, necessaria per chi vive nei piccoli Comuni per raggiungere servizi essenziali.

La Regione Campania intende dare continuità alle esperienze in corso, puntando in via prioritaria, su quelle dimensioni territoriali la cui rilevanza strategica è stata già riconosciuta, e consolidata. Continuare a sostenere le esperienze di progettazione territoriale integrata è fondamentale, valorizzando le lezioni apprese dalle esperienze e dagli strumenti utilizzati nel corso dei precedenti cicli di programmazione, evitando pur sempre sovrapposizioni ed in coerenza sia con le previsioni dell'Accordo di Partenariato 2021-27 che con il Documento Strategico Regionale della Campania, , sono state individuate tre nuove aree interne, ("Alto Matese", "Sele Tanagro Alburni SETA" e "Fortore") che si vanno ad aggiungere alle 4 della programmazione in corso.

Nell'ambito del Documento Regionale di Indirizzo Strategico (DRIS) periodo di programmazione 2021/2027, adottato con DGR 489 del 12/11/2020, la Regione Campania, relativamente all'obiettivo di Policy "Un'Europa più vicina ai cittadini" (OP5), pone come obiettivi specifici la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di Aree urbane, Aree interne e Aree vaste. La centralità e l'attenzione verso questa scelta strategica scaturisce dalla consapevolezza del ruolo che le strategie territoriali possono svolgere per il contrasto delle situazioni di marginalità, povertà e fragilità e per il miglioramento dei servizi, nonché per lo sviluppo delle potenzialità legate al patrimonio culturale, ambientale e naturale
